

浦安センター遮熱処理効果測定

2026年6月12日 13:00 外気温約30℃



遮熱処理済み



34.6°C
- 11.6



遮熱未処理



46.2°C

南側ガラス面参考値



38.1°C


南側壁面参考値



34.0°C



右手側からサーモバリアシート
敷設処理中。約50%の進捗

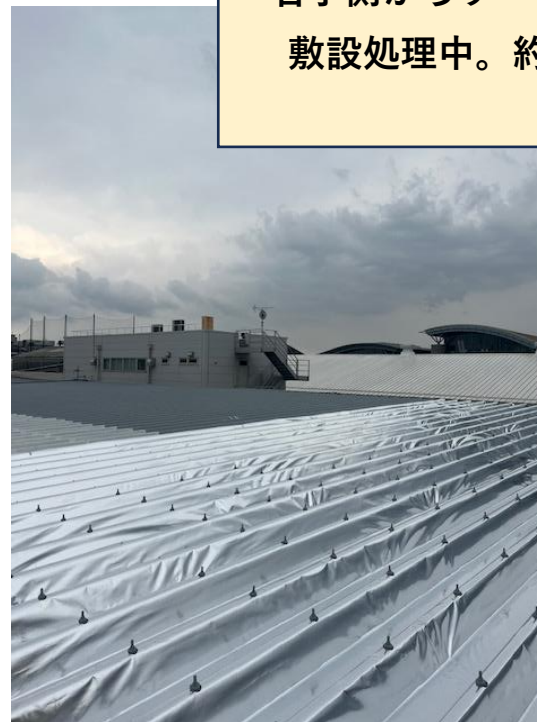

足場設置状況

